



สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

# คู่มือ

การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

## ช่องทางให้บริการ

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

☎ 0 2283 1636, 0 2283 1639

✉ saraban.monitor@mots.go.th

📍 เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก  
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพมหานคร 10100

🌐 <https://www.mots.go.th>

# สารบัญ

เนื้อหา	หน้าที่
การเข้าสู่ระบบรายงาน	1
การรายงานผลการดำเนินงานประเภท ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ - ค่าตอบแทนใช้สอย - ค่าเช่าบ้าน - ค่าสาธารณูปโภค - ค่าอบรมสัมมนา - ค่าระค่าสมาชิก WTO /ASEAN NTOs Fund/MTCO	2
การรายงานผลการดำเนินงานประเภท รายการครุภัณฑ์ - รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง - งานจ้างที่ปรึกษา	7
การรายงานผลการดำเนินงานประเภท งบจังหวัด และกลุ่มจังหวัด	12
ค่าธรรมเนียมการใช้งานระบบ	14
เอกสารหลักฐานประกอบการใช้งานระบบ	14

# การเข้าสู่ระบบรายงาน

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้งานเข้าสู่การรายงานในระบบสารสนเทศโดยใช้รหัสผู้ใช้งาน

\*ทั้งนี้กลุ่มติดตามและประเมินผลเป็นผู้กำหนด Username/ password ให้ทุกหน่วยเป็นระยะเวลา 1 วัน\*

ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

phetchaburi

.....

แสดงรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ คู่มือการใช้งาน

- ขั้นตอนที่ 2 - ผู้ใช้งานเลือกเมนูรายการ/โครงการด้านซ้ายมือและเลือกเมนู > จัดสรรโครงการ > โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของรายการ/โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ "ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที"

MOTS PLAN

ยินดีต้อนรับ : phetchaburi | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

จัดสรรโครงการ > โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ค้นหา โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ปี 2566

ชื่อแผนงาน/โครงการ

สถานะ

ประเภทงบรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

ประเภทแผนงาน

แผนงาน

ค้นหา แสดงทั้งหมด ส่งออกไฟล์ excel

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้จัดสรร/หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา(PO)/รายจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ		
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สททจ.เพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	27,900.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น(100%)	🔍	✎
2	ค่าสาธารณูปโภค	95,150.00	95,150.00	0.00	69,092.08	0.00	ดำเนินการเอง(50%)	🔍	✎

# กรณีที่ 1 การรายงานผลการดำเนินงานประเภท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ - ค่าตอบแทนใช้สอย - ค่าเช่าบ้าน - ค่าสาธารณูปโภค  
ค่าอบรมสัมมนา - ชำระค่าสมาชิก WTO /ASEAN NTOs Fund/MTCO

ขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการ/โครงการที่จะรายงาน คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”  
“ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที”



MOTS PLAN

MAIN MENU

จัดการโครงการ ▶ โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

MOT010

ค้นหา โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ปี 2566

ชื่อแผนงาน/โครงการ

สถานะ

ประเภทงบรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

ประเภทแผนงาน

แผนงาน

ค้นหา แสดงทั้งหมด ส่งออกไฟล์ excel

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้จัดสรร /หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา(PO) /รอจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ	
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สททก.เพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	27,900.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเสร็จสิ้น(100%)	
2	ค่าสาธารณูปโภค	95,150.00	95,150.00	0.00	69,092.08	0.00	ดำเนินการเอง(50%)	

จะพบกับแถบเมนูรายงาน จำนวน 4 แถบ ประกอบด้วย

1) ความเชื่อมโยง 2) รายละเอียด 3) การเบิกจ่ายงบประมาณ 4) การประเมินผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ใช้งานศึกษาข้อมูลความเชื่อมโยงของรายการ/โครงการที่ได้รับการจัดสรร  
“ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที”

MOTS PLAN

MAIN MENU

จัดการโครงการ ▶ โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

MOT010

ความเชื่อมโยงกับแผน รายละเอียด การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการดำเนินการ

ข้อมูล รายการที่ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ปีงบประมาณ	รายการ	ปีงบประมาณ
2566	ค่าสาธารณูปโภค	2566
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
ประเด็นแผนแม่บท	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	
เป้าหมายแผนแม่บท	ไม่สอดคล้อง	
ตัวชี้วัดแผนแม่บท	ไม่สอดคล้อง	
ประเด็นแผนแม่บทย่อย	ไม่สอดคล้อง	
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ไม่สอดคล้อง	
ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย	ไม่สอดคล้อง	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ไม่สอดคล้อง	
เป้าหมายหมุดหมาย	ไม่สอดคล้อง	
ตัวชี้วัดหมุดหมาย	ไม่สอดคล้อง	
แผนพัฒนา	ไม่สอดคล้อง	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ประเด็นการพัฒนา	ไม่สอดคล้อง	
กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	ไม่สอดคล้อง	
แผนปฏิบัติการประจำปีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ไม่สอดคล้อง	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้อง	
เป้าประสงค์	ไม่สอดคล้อง	
ตัวชี้วัด	ไม่สอดคล้อง	
ประเภทแผนงาน	แผนงานพื้นฐาน	
แผนงาน	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ	แผนพื้นฐาน : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	

# ขั้นตอนที่ 3 ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายการ/โครงการที่ได้รับการจัดสรรตามหัวข้อที่กำหนดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และกำหนดตัวชี้วัดให้ถูกต้อง โดยกดปุ่มเพิ่ม “ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที”

MOTS PLAN
ยินดีต้อนรับ : phetchaburi | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

จัดสรรโครงการ > โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
MOT010

MAIN MENU

- จัดสรรโครงการ
- รายการ/โครงการ
- โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- โครงการกันเงินเหลือมี
- รายงานงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด
- รายงานผล

ความเชื่อมโยงกับแผน
รายละเอียด
การเบิกจ่ายงบประมาณ
การประเมินผลการดำเนินการ

**สาระสำคัญของแผนงาน/โครงการ** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานการทอเยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

**วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ** 1) เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน ค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าโทรศัพท์มือถือ ของสำนักงานการทอเยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของหน่วยงาน  
2) เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 1-3

**เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ** 1. การบริหารงานของสำนักงานการทอเยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีมีความสะดวก คล่องตัว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
2. สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน จำนวน 4 ไตรมาส  
3. งบประมาณที่ได้รับเพียงพอในงบประมาณ 2566

**พื้นที่ดำเนินการ(ภูมิศาสตร์)** สำนักงานการทอเยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี สนามกีฬาจังหวัด (ดอนคาน) ถนนดีริรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

**กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ** ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการทอเยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

**ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการ

**เขตพัฒนาการทอเยว** หังทะเลตะวันตก

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ(Output)**

เชิงปริมาณ	เป้าหมาย	หน่วยนับ
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน	4.00	ไตรมาส

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ(Output)**

เชิงคุณภาพ	เป้าหมาย	หน่วยนับ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	100.00	ร้อยละ

**กิจกรรม**

กิจกรรม	งบประมาณตามแผน	เริ่มเดือน	ถึงเดือน
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือน ตุลาคม 2565	4,722.38	ตุลาคม	ตุลาคม
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนพฤศจิกายน 2565	6,283.38	พฤศจิกายน	พฤศจิกายน
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนธันวาคม 2565	5,752.38	ธันวาคม	ธันวาคม
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนมกราคม 2566	8,422.38	มกราคม	มกราคม
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2566	9,172.38	กุมภาพันธ์	กุมภาพันธ์
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนมีนาคม 2566	13,914.38	มีนาคม	มีนาคม
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนเมษายน 2566	16,914.38	เมษายน	เมษายน
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนพฤษภาคม 2566	15,054.38	พฤษภาคม	พฤษภาคม
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนมิถุนายน 2566	14,914.38	มิถุนายน	มิถุนายน
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนกรกฎาคม 2566	0.00	กรกฎาคม	กรกฎาคม
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนสิงหาคม 2566	0.00	สิงหาคม	สิงหาคม
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนกันยายน 2566	0.00	กันยายน	กันยายน

**แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)**

ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
ค.ย. 4,722.38	ม.ค. 8,422.38	เม.ย. 16,914.38	ก.ค. 0.00
ธ.ย. 6,283.38	ก.พ. 9,172.38	พ.ค. 15,054.38	ส.ค. 0.00
ธ.ค. 5,752.38	มี.ค. 13,914.38	มิ.ย. 14,914.38	ก.ย. 0.00
<b>16,758.14</b>	<b>31,509.14</b>	<b>46,883.14</b>	<b>0.00</b>

บันทึก

กลับ

กดบันทึกก่อนดำเนินการเมนูถัดไปทุกครั้ง

**สำคัญ :** จำเป็นต้องกรอกเป็นรายเดือนให้ครบถ้วนตามรอบปีงบประมาณ (ตุลาคม - กันยายน)



**สำคัญ :** การกำหนดกิจกรรมของการดำเนินงานภายใต้รายการ/โครงการ ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ขอให้ระบุกิจกรรมเป็นรายเดือนเนื่องจากการดำเนินงานจะส่งผลไปถึงแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยจะแสดงผลในตารางแผนการใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดในแถบเมนูต่อไป

## ขั้นตอนที่ 4 ระบุความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะนี้จะกำหนดให้ชำระเป็นรายเดือนและไม่เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจะต้องเลือกความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็น "ดำเนินการเอง" พร้อมระบุวงเงินรวมที่ดำเนินการ ที่เป็นปัจจุบันในช่อง "งบประมาณดำเนินการเอง" และรายงานผลการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนตามแผนที่กำหนดไว้ก่อนหน้า พร้อมระบุวันที่เบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง และกดบันทึกเพื่อรายงานในเมนูถัดไป "ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที"

MOTS PLAN

ยินดีต้อนรับ : phetchaburi | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

MAIN MENU

- จัดการโครงการ
- รายการโครงการ
- โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- โครงการกันเงินเหลือมี
- รายงานงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด
- รายงานผล

จัดสรรโครงการ ▶ โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ความเชื่อมโยงกับแผน | รายละเอียด | การเบิกจ่ายงบประมาณ | การประเมินผลการดำเนินการ

ความก้าวหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้จัดสรร/หลังโอนเปลี่ยนแปลง [งบ2] 95,150.00

รวมงบประมาณตามแผน 95,150.00 เงินเหลือจ่าย 0.00

ยังไม่ดำเนินการ  อนุมัติจัดทำโครงการ (Kick Off Project)  ปรับแบบรูปรายการ/อนุมัติ TOR และราคากลาง  ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญชวนหาผู้รับจ้าง  ประกาศผู้ชนะ  อนุมัติ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) งบประมาณที่เหลือเสนอ [งบ3]  ลงนามสัญญา งบประมาณที่เหลือลงนามสัญญา [งบ4]

วันที่อนุมัติจัดทำโครงการ | วันที่อนุมัติ TOR | วันที่ประกาศเชิญชวน | วันที่ประกาศผู้ชนะ | วิธีการดำเนินการ | วันที่อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง | วันที่ลงนามสัญญา

วงเงิน | บาท | บาท

เลขที่สัญญา | เลขที่คุดสัญญา (e-GP) | สัญญามีผล ณ วันที่ | จำนวนงวดงาน | งวด | ชื่อคู่สัญญา | เลขที่ PO | วันที่สิ้นสุด

ดำเนินการเอง  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น

งบประมาณที่ดำเนินการเอง [งบ4] 95,150.00

บันทึกความก้าวหน้าโครงการที่ ผลการดำเนินการ

กิจกรรม

กิจกรรม	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	วันที่
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือน ตุลาคม 2565	4,722.38	3,724.46	30/12/2565
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนพฤศจิกายน 2565	6,283.38	3,906.68	30/11/2565
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนธันวาคม 2565	5,752.38	17,411.65	30/12/2565
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนมกราคม 2566	8,422.38	13,258.16	31/01/2566
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2566	9,172.38	14,874.48	28/02/2566
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนมีนาคม 2566	13,914.38	13,734.05	31/03/2566
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนเมษายน 2566	16,914.72	3,256.60	28/04/2566
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนพฤษภาคม 2566	15,054.00		
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนมิถุนายน 2566	14,914.00		
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนกรกฎาคม 2566	0.00		
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนสิงหาคม 2566	0.00		
เบิกค่าสาธารณูปโภค เดือนกันยายน 2566	0.00		

บันทึก | กลับไป

กดบันทึกก่อนดำเนินการเมนูถัดไปทุกครั้ง

ในส่วนนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน ซึ่งการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการปรับปรุงข้อมูลเมื่อสถานะของโครงการมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เนื่องจากจะนำไปประมวลผลเพื่อนำผลการดำเนินงานออกมารายงานเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

**หมายเหตุ :** เงินเหลือจ่าย เป็นจำนวนเงินที่คำนวณจากงบประมาณที่ได้จัดสรร (งบ.2) – วงเงินที่มีการลงนามสัญญาหรือวงเงินที่ใช้ดำเนินการเอง ดังนั้นหากยังไม่มี การลงนามสัญญาจำนวนเงินที่ปรากฏจะเป็นจำนวนที่เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือหลังโอนเปลี่ยนแปลง)

# ขั้นตอนที่ 5 ระบุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ให้ครบถ้วน ทุกหัวข้อ “ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที”

MOTS PLAN ยินดีต้อนรับ : phetchaburi | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

MAIN MENU จัดสรรโครงการ ▶ โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ MOT010

จัดการโครงการ

รายงาน/โครงการ

โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โครงการกันเงินเหลือมีปี

รายงานงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด

รายงานผล

ความเชื่อมโยงกับแผน

ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเป็นผลผลิตของโครงการ(Output) 50%

จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อน และค่าไปรษณีย์ รวม 5 รายการ ในไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ตามแผนที่กำหนด

ผลลัพธ์ของโครงการ(OutComes)

1. ไม่ถูกต้องค่าสาธารณูปโภคส่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามปกติและสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. งบประมาณเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2

ผลกระทบ(Impact)

1. ผลกระทบเชิงลบ : ค่าไฟฟ้ามีปริมาณการใช้งานมากขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อน  
2. การประหยัดพลังงานส่งผลให้มีเงินงบประมาณเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย

ผลการตรวจสอบข้อมูล


ไม่มีผลกระทบ  เชิงบวก  มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  เชิงลบ

ผลการดำเนินงาน

1. การบริหารงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 73.74

การเบิกจ่ายงบประมาณ

การประเมินผลการดำเนินการ

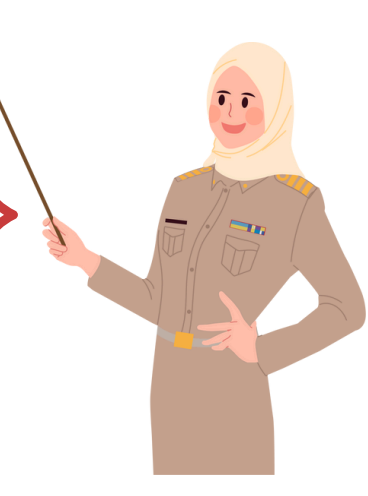

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ(Output)

เชิงปริมาณ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลลัพธ์
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน	4.00	ไตรมาส	ต้องระบุ 3.00

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ(Output)

เชิงคุณภาพ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลลัพธ์
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	100.00	ร้อยละ	ต้องระบุ 73.74

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด และ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ประเภทปัญหา	ปัญหาในการดำเนินโครงการ	แจ้งโดย	แจ้งเมื่อวันที่	ข้อเสนอแนะ
<input type="checkbox"/>				

เพิ่มปัญหา ลบปัญหา

ข้อสั่งการ

ข้อสั่งการ	สั่งการโดย	สั่งการเมื่อวันที่
<input type="checkbox"/>		

เพิ่มข้อสั่งการ ลบข้อสั่งการ

ภาพกิจกรรมโครงการ

รูป	คำอธิบาย
<input type="checkbox"/>	

เพิ่มรูป ลบรูป

ไฟล์เอกสาร

ไฟล์	คำอธิบาย
<input type="checkbox"/>	

เพิ่มไฟล์ ลบไฟล์

บันทึก กลับไป

## หมายเหตุ :

1. ผลผลิตของโครงการ(Output) คือ ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น
2. ผลลัพธ์ของโครงการ(OutComes) คือ ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ
3. ผลกระทบ (Impact) คือ ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต

เป็นการบันทึกข้อมูลเมื่อการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นโดยระบบจะแสดงค่าตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ในแถบ “รายละเอียด” มาแสดง เพื่อให้กรอก “ผลลัพธ์” ของตัวชี้วัดตามที่ได้กำหนดไว้

## ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบผลการรายงานผ่านหน้าสรุปผล "ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที"

MOTS PLAN ยินดีต้อนรับ : phetchaburi | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

MAIN MENU MOT010

จัดสรรโครงการ ▶ โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ค้นหา โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ปี: 2566

ชื่อแผนงาน/โครงการ:

สถานะ:







ประเภทงบรายจ่าย:

ประเภทรายจ่าย:

ประเภทแผนงาน:

แผนงาน:

ค้นหา แสดงทั้งหมด ส่งออกไฟล์ excel

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้จัดสรร / หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา(PO) / รोजาย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ	
1	เครื่องอัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สหจ. เพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	27,900.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น(100%)	 
2	ค่าสาธารณูปโภค	95,150.00	95,150.00	24,983.92	70,166.08	24,983.92	ดำเนินการเอง(50%)	 
3	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	ดำเนินการเอง(50%)	 

### หมายเหตุ :

#### ความหมายของแถบสี

**แถบสีเขียว** หมายถึง ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรายไตรมาส

**แถบสีแดง** หมายถึง ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรายไตรมาส

#### ความหมายของข้อความในแถบเมนูสถานะ

- 0 % หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ
- 5 % หมายถึง อนุมัติจัดทำโครงการ (Kick Off Project)
- 10 % หมายถึง ปรับแบบรูปรายการ/อนุมัติ TOR และราคากลาง
- 20 % หมายถึง ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญชวนหาผู้รับจ้าง
- 30 % หมายถึง ประกาศผู้ชนะ
- 40 % หมายถึง อนุมัติ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- 50 % หมายถึง ลงนามสัญญา
- 50 % หมายถึง ดำเนินการเอง
- 100% หมายถึง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น

# กรณีที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานประเภท รายการครุภัณฑ์ - รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง - งานจ้างที่ปรึกษา


ขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการ/โครงการที่จะรายงาน คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข”   
“ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที”

MOTS PLAN ยินดีต้อนรับ : phetchaburi | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

MAIN MENU จัดสรรโครงการ ▶ โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ MOT010

จัดสรรโครงการ

รายการ/โครงการ

โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

โครงการกึ่งเงินเหลื่อมปี

รายงานงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด

รายงานผล

ค้นหา โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ค้นหา

ปี 2566

ชื่อแผนงาน/โครงการ

สถานะ





ประเภทงบรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย

ประเภทแผนงาน

แผนงาน

ค้นหา แสดงทั้งหมด ส่งออกไฟล์ excel

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้จัดสรร /หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา(PO) /รอจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ	
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สททจ.เพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	27,900.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเสร็จสิ้น(100%)	 
2	ค่าสาธารณูปโภค	95,150.00	95,150.00	0.00	69,092.08	0.00	ดำเนินการเอง(50%)	 

จะพบกับแถบเมมูรายงาน จำนวน 4 แถบ ประกอบด้วย

1) ความเชื่อมโยง 2) รายละเอียด 3) การเบิกจ่ายงบประมาณ 4) การประเมินผลการดำเนินงาน


ขั้นตอนที่ 2 ผู้ใช้งานศึกษาข้อมูลความเชื่อมโยงของรายการ/โครงการที่ได้รับการจัดสรร  
“ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที”

MOTS PLAN ยินดีต้อนรับ : phetchaburi | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

MAIN MENU จัดสรรโครงการ ▶ โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ MOT010

จัดสรรโครงการ

รายการ/โครงการ

โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ 


โครงการกึ่งเงินเหลื่อมปี

รายงานงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด

รายงานผล

ค้นหา โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ความเชื่อมโยงกับแผน รายละเอียด การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการดำเนินการ

ข้อมูล รายการที่ได้รับงบประมาณเพราะ  งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ปีงบประมาณ	รายการ	ปีงบประมาณ
2566	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สททจ.เพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	2566
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
ประเด็นแผนแม่บท	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	
เป้าหมายแผนแม่บท	ไม่สอดคล้อง	
ตัวชี้วัดแผนแม่บท	ไม่สอดคล้อง	
ประเด็นแผนแม่บทย่อย	ไม่สอดคล้อง	
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย	ไม่สอดคล้อง	
ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย	ไม่สอดคล้อง	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ไม่สอดคล้อง	
เป้าหมายหมุดหมาย	ไม่สอดคล้อง	
ตัวชี้วัดหมุดหมาย	ไม่สอดคล้อง	
แผนพัฒนา	ไม่สอดคล้อง	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ประเด็นการพัฒนา	ไม่สอดคล้อง	
กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา	ไม่สอดคล้อง	
แผนปฏิบัติการประจำปีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ไม่สอดคล้อง	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ไม่สอดคล้อง	
เป้าประสงค์	ไม่สอดคล้อง	
ตัวชี้วัด	ไม่สอดคล้อง	
ประเภทแผนงาน	แผนงานพื้นฐาน	
แผนงาน	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ	แผนพื้นฐาน : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	1. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง บังคับในการขับเคลื่อนงานกีฬาให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	1.1 จำนวนนโยบาย แผนและงานด้านการกีฬาที่ได้รับการส่งเสริม จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	1.2 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านการกีฬา ร้อยละ 95 (สป.กก. กพล. มทช. กกท.)	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	1. ขับเคลื่อนนโยบาย/แผน ด้านการกีฬาไปสู่การปฏิบัติ	
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ	1.1 จำนวนนโยบาย แผนและงานด้านการกีฬาที่ได้รับการส่งเสริม จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง (สป.กก.)	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ	1.2 ความสำเร็จของการดำเนินโครงการด้านกีฬา ร้อยละ 95 (สป.กก.)	
ผลผลิต/โครงการ	แผนงานพื้นฐาน : ผลผลิตที่ 1 นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	

### ขั้นตอนที่ 3 ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายการ/โครงการที่ได้รับการจัดสรรตามหัวข้อที่กำหนดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และกำหนดตัวชี้วัดให้ถูกต้อง โดยกดปุ่มเพิ่ม “ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที”

MOTS PLAN
ยินดีต้อนรับ : phetchaburi | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

MAIN MENU

- จัดการโครงการ
- รายการ/โครงการ
  - โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
  - โครงการเงินเหลือมี
  - รายงานงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด
  - รายงานผล

จัดสรรโครงการ > โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ความเชื่อมโยงกับแผน	รายละเอียด	การเบิกจ่ายงบประมาณ	การประเมินผลการดำเนินการ
สาระสำคัญของแผนงาน/โครงการ	ขับเคลื่อน นโยบาย/แผนและงานด้านการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		
วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>เพื่อจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ในหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของหน่วยงาน</li> <li>เพื่อให้การบริหารงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามแผนที่กำหนดในไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 รายการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบ</li> </ol>		
เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารงาน จำนวน 1 เครื่อง</li> <li>การเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์สำนักงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด</li> </ol>		
พื้นที่ดำเนินการ(ภูมิศาสตร์)	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี สนามกีฬาจังหวัด (ดอนคาบ) ถนนศิริรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี		
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี</li> <li>หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬา</li> </ol>		
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	<ol style="list-style-type: none"> <li>ข้าราชการและเจ้าหน้าที่</li> <li>ประชาชนทั่วไป</li> <li>ผู้ประกอบการ/ร้านค้า</li> </ol>		
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว	ฝั่งทะเลตะวันตก		

**! สำคัญ :**  
จำเป็นต้องระบุให้ครบถ้วน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ(Output)			
เชิงปริมาณ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	1.00	เครื่อง	เพิ่ม ลบ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ(Output)			
เชิงคุณภาพ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด	100.00	ร้อยละ	เพิ่ม ลบ

กิจกรรม				
กิจกรรม	งบประมาณตามแผน	เริ่มเดือน	ถึงเดือน	
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	27,900.00	พฤศจิกายน	พฤศจิกายน	เพิ่ม ลบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)																												
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ต.ค.</td><td></td></tr> <tr><td>พ.ย.</td><td style="text-align: right;">27,900.00</td></tr> <tr><td>ธ.ค.</td><td style="text-align: right;">27,900.00</td></tr> </table>	ต.ค.		พ.ย.	27,900.00	ธ.ค.	27,900.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ม.ค.</td><td></td></tr> <tr><td>ก.พ.</td><td></td></tr> <tr><td>มี.ค.</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> </table>	ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.	0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>เม.ย.</td><td></td></tr> <tr><td>พ.ค.</td><td></td></tr> <tr><td>มิ.ย.</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> </table>	เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.	0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>ก.ค.</td><td></td></tr> <tr><td>ส.ค.</td><td></td></tr> <tr><td>ก.ย.</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> </table>	ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.	0.00	เพิ่ม ลบ
ต.ค.																												
พ.ย.	27,900.00																											
ธ.ค.	27,900.00																											
ม.ค.																												
ก.พ.																												
มี.ค.	0.00																											
เม.ย.																												
พ.ค.																												
มิ.ย.	0.00																											
ก.ค.																												
ส.ค.																												
ก.ย.	0.00																											

บันทึก
กลับไป

กดบันทึกก่อนดำเนินการเมนูถัดไปทุกครั้ง

**! สำคัญ :**  
จำเป็นต้องกรอก  
1) ข้อมูลตัวชี้วัดให้ครบถ้วน  
2) ระบุกิจกรรมเป็นรายเดือนตามรอบปีงบประมาณ (ตุลาคม - กันยายน)

**สำคัญ :** การกำหนดกิจกรรมของการดำเนินงานภายใต้รายการ/โครงการ ขอให้ระบุเป็นรายกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้รายการ/โครงการ เช่น รายการครุภัณฑ์ กิจกรรมคือ การจัดซื้อ..., รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง กิจกรรมคือ รายละเอียดของแต่ละงวดงาน เป็นต้น เนื่องจากการกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานจะส่งผลไปถึงแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนโดยจะแสดงผลในตารางแผนการใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ เพื่อใช้สำหรับการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดในแถบเมนูต่อไป

## ขั้นตอนที่ 4 ระบุความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะนี้จะกำหนดให้ชำระเป็น "งวดงาน" ผู้รายงานจะต้องเลือกความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน พร้อมระบุวงเงินที่ได้ลงนามสัญญา และรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้ก่อนหน้า พร้อมระบุวันที่เบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง และกดบันทึกเพื่อรายงานในเมนูถัดไป  
"ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที"

**สำคัญ :** จำเป็นต้องกรอกเป็นรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกช่อง

**สำคัญ :** เมื่อดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นให้กดเลือกดำเนินการเสร็จสิ้นให้เรียบร้อย

**ไม่ต้องระบุ**

**กดบันทึกก่อนดำเนินการเมนูถัดไปทุกครั้ง**

งบประมาณที่ได้จัดสรร/หลังโอนเปลี่ยนแปลง [งบ2]	27,900.00	เงินเหลือจ่าย	0.00
รวมงบประมาณตามแผน	27,900.00		

ยังไม่ดำเนินการ	หมายเหตุ	วันที่อนุมัติจัดทำโครงการ	เลขที่โครงการ	65117247876	
<input type="radio"/> อนุมัติจัดทำโครงการ (Kick Off Project)					
<input type="radio"/> ปรับแบบรูปรายการ/อนุมัติ TOR และราคากลาง		วันที่อนุมัติ TOR			
<input type="radio"/> ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญชวนหาผู้รับจ้าง		วันที่ประกาศเชิญชวน	04/11/2565		
<input type="radio"/> ประกาศผู้ชนะ		วันที่ประกาศผู้ชนะ	07/11/2565	วิธีการดำเนินการ	ชื่อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
<input type="radio"/> อนุมัติ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)		วันที่อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง	07/11/2565	วงเงิน	27,900.00 บาท
<input type="radio"/> ลงนามสัญญา		วันที่ลงนามสัญญา	07/11/2565	วงเงิน	27,900.00 บาท
เลขที่สัญญา	10/2566	ชื่อคู่สัญญา	บริษัท เพชร ดอทคอม จำกัด		
เลขที่คุดสัญญา (e-GP)	651114201766	เลขที่ PO	4100005830		
สัญญามีผล ณ วันที่	08/11/2565	วันที่สิ้นสุด	30/11/2565		
จำนวนงวดงาน	1 งวด				

งวด 1	วันที่กำหนดส่งมอบงาน	14/11/2565	จำนวน	27,900.00	บาท	วันที่ส่งเบิก	16/11/2565

กิจกรรม	กิจกรรม	งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	วันที่
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens		27,900.00	27,900.00	18/11/2565

ในส่วนนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงาน ซึ่งการบันทึกข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นการปรับปรุงข้อมูลเมื่อสถานะของโครงการมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เนื่องจากจะนำไปประมวลผลเพื่อนำผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

**หมายเหตุ :** เงินเหลือจ่าย เป็นจำนวนเงินที่คำนวณจากงบประมาณที่ได้จัดสรร (งบ.2) – วงเงินที่มีการลงนามสัญญาหรือวงเงินที่ใช้ดำเนินการเอง ดังนั้นหากยังไม่มีผลการลงนามสัญญาจำนวนเงินที่ปรากฏจะเป็นจำนวนที่เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหรือหลังโอนเปลี่ยนแปลง)

# ขั้นตอนที่ 5 ระบุผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ให้ครบถ้วน ทุกหัวข้อ “ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที”

**MOTS PLAN** | ยินดีต้อนรับ : phetchaburi | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

MAIN MENU

- จัดสรรโครงการ
- รายการโครงการ
- โครงการที่หน่วยงานโครงการจัดสรรงบประมาณ
- โครงการกันเงินเหลือมี
- รายงานงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด
- รายงานผล

จัดสรรโครงการ ▶ โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

MOT010

การประเมินผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินการคิดเป็นผลผลิตของโครงการ(Output) 100%

ผลผลิตของโครงการ(Output) เครื่องผลิตดีมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง

ผลลัพธ์ของโครงการ(OutComes) แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอแผนงานโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น การจัดประชุมระบบออนไลน์ ทำให้ได้รับทราบข้อมูลทั่วถึง

ผลกระทบ(Impact) ไม่มี

ผลการตรวจสอบข้อมูล ผลการดำเนินงาน  ไม่มีผลกระทบ  เชิงบวก  มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  เชิงลบ

1. การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด  
2. การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ(Output)	เชิงปริมาณ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลลัพธ์
เครื่องผลิตดีมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens		1.00	เครื่อง	ต้องระบุ 1.00

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ(Output)	เชิงคุณภาพ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลลัพธ์
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด		100.00	ร้อยละ	ต้องระบุ 100.00

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ(Output)	เชิงปริมาณ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลลัพธ์
เครื่องผลิตดีมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens		1.00	เครื่อง	ต้องระบุ 1.00

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายเชิงคุณภาพ(Output)	เชิงคุณภาพ	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ผลลัพธ์
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด		100.00	ร้อยละ	ต้องระบุ 100.00

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด และ ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

<input type="checkbox"/>	ประเภทปัญหา	ปัญหาในการดำเนินโครงการ	แจ้งโดย	แจ้งเมื่อวันที่	ข้อเสนอแนะ
<input type="button" value="เพิ่มปัญหา"/> <input type="button" value="ลบปัญหา"/>					

ข้อสั่งการ

<input type="checkbox"/>	ข้อสั่งการ	สั่งการโดย	สั่งการเมื่อวันที่
<input type="button" value="เพิ่มข้อสั่งการ"/> <input type="button" value="ลบข้อสั่งการ"/>			

ภาพกิจกรรมโครงการ

<input type="checkbox"/>	รูป	คำอธิบาย
<input type="checkbox"/>	Choose File No file chosen <b>ต้องระบุ</b>	เครื่องผลิตดีมีเดีย โปรเจคเตอร์ <b>ต้องระบุ</b>
<input type="button" value="เพิ่มรูป"/> <input type="button" value="ลบรูป"/>		

ไฟล์เอกสาร

<input type="checkbox"/>	ไฟล์	คำอธิบาย
<input type="button" value="เพิ่มไฟล์"/> <input type="button" value="ลบไฟล์"/>		

กดบันทึกก่อนดำเนินการเมนูถัดไปทุกครั้ง

**หมายเหตุ :** เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้ผู้รายงานรายงานผลการดำเนินงานในเมนู "การประเมินผล"

1. ผลผลิตของโครงการ(Output) คือ ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดำเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น
2. ผลลัพธ์ของโครงการ(OutComes) คือ ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ
3. ผลกระทบ (Impact) คือ ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต

เป็นการบันทึกข้อมูลเมื่อการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นโดยระบบจะแสดงค่าตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ในแถบ "รายละเอียด" มาแสดง เพื่อให้กรอก "ผลลัพธ์" ของตัวชี้วัดตามที่ได้กำหนดไว้

# ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบผลการรายงานผ่านหน้าสรุปผล

MOTS PLAN
🌐
ยินดีต้อนรับ : phetchaburi | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

MAIN MENU
จัดสรรโครงการ ▶ โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
MOT010

MAIN MENU

- จัดสรรโครงการ
- รายการโครงการ
- โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- โครงการกันเงินเหลือมีปี
- รายงานงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด
- รายงานผล

ค้นหา โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ปี
2566

ชื่อแผนงาน/โครงการ

สถานะ
▼

ประเภทงบรายจ่าย
▼

ประเภทรายจ่าย
▼

ประเภทแผนงาน
▼

แผนงาน
▼

ค้นหา
แสดงทั้งหมด
ส่งออกไฟล์ excel

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้จัดสรร / หลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผูกพันสัญญา(PO) / รोजาย	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะ	
1	เครื่องอัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens สหจ. เพชรบุรี ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง	27,900.00	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น(100%)	🔍 ✎
2	ค่าสาธารณูปโภค	95,150.00	95,150.00	24,983.92	70,166.08	24,983.92	ดำเนินการเอง(50%)	🔍 ✎
3	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	ดำเนินการเอง(50%)	🔍 ✎

## หมายเหตุ :

### ความหมายของแถบสี

**แถบสีเขียว** หมายถึง ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรายไตรมาส

**แถบสีแดง** หมายถึง ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรายไตรมาส

### ความหมายของข้อความในแถบเมนูสถานะ

- 0 % หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ
- 5 % หมายถึง อนุมัติจัดทำโครงการ (Kick Off Project)
- 10 % หมายถึง ปรับแบบรูปรายการ/อนุมัติ TOR และราคากลาง
- 20 % หมายถึง ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เชิญชวนหาผู้รับจ้าง
- 30 % หมายถึง ประกาศผู้ชนะ
- 40 % หมายถึง อนุมัติ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- 50 % หมายถึง ลงนามสัญญา
- 50 % หมายถึง ดำเนินการเอง
- 100% หมายถึง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น

# กรณีที่ 3 การรายงานผลการดำเนินงานประเภท งบจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” “ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที”

MOTS PLAN | ยินดีต้อนรับ : phetchaburi | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

จัดสรรโครงการ > รายงานงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด

ค้นหา โครงการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ปี: 2566

ชื่อแผนงาน/โครงการ: [ ]

สถานะ: [ ]

จังหวัด: เพชรบุรี

ค้นหา | แสดงทั้งหมด | ส่งออกไฟล์ excel

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	สถานะ
1	โครงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล	1,320,900.00	ยังไม่ดำเนินการ

หน้าละ 10 รายการ | 1 สิ่ง 1 จาก 1

เพิ่มข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน “ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที”

MOTS PLAN | ยินดีต้อนรับ : phetchaburi | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ออกจากระบบ

จัดสรรโครงการ > รายงานงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด

ปีงบประมาณ: [ ]

ชื่อรายการ/โครงการ: [ ]

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: [ ] บาท

แหล่งงบประมาณ: [ ]

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580): [ ]

ประเด็นแผนแม่บท: [ ]

เป้าหมายแผนแม่บท: [ ]

ตัวชี้วัดแผนแม่บท: [ ]

ประเด็นแผนแม่บทย่อย: [ ]

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย: [ ]

ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย: [ ]

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13: [ ]

เป้าหมายหมวดหมาย: [ ]

ตัวชี้วัดหมวดหมาย: [ ]

แผนพัฒนา: [ ]

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ประเด็นการพัฒนา: [ ]

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา: [ ]

แผนปฏิบัติการประจำปีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา: [ ]

ประเด็นยุทธศาสตร์: [ ]

เป้าประสงค์: [ ]

ตัวชี้วัด: [ ]

บันทึก | กลับไป

กด "บันทึก" ก่อนดำเนินการเมนูถัดไปทุกครั้ง

ต้องระบุให้ครบถ้วน

## หมายเหตุ :

เมื่อกรอกข้อมูลรายการ/โครงการเสร็จสิ้น ต้องกดบันทึกให้เรียบร้อย และรายการตั้งต้นที่ท่านกรอกจะกลับไปอยู่ที่หน้าแรกของเมนูรายงานงบจังหวัดกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินการรายงานผลต่อไป

### ขั้นตอนที่ 3 เลือกรายการ/โครงการที่จะรายงาน คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” “ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที”

The screenshot shows the MOTS PLAN interface. On the left is a navigation menu with 'รายงานงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด' highlighted. The main area displays a search form for projects and a table with one entry. A yellow hand icon points to the 'แก้ไข' (Edit) button in the table's action column.

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	สถานะ
1	โครงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล	1,320,900.00	ยังไม่ดำเนินการ

จะพบกับแถบเมนูรายงาน จำนวน 3 แถบ ประกอบด้วย  
**1) ความเชื่อมโยง 2) รายละเอียด 3) การประเมินผลการดำเนินงาน**

### ขั้นตอนที่ 4 ผู้ใช้งานตรวจสอบข้อมูลความเชื่อมโยงของรายการ/โครงการที่ได้รับการจัดสรรจากแถบเมนูความเชื่อมโยงกับแผน “ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที”

The screenshot shows the 'ความเชื่อมโยงกับแผน' (Linkage with Plan) tab selected. A yellow hand icon points to the tab. The page displays a detailed form for project linkage, including fields for year, project name, budget, and various assessment criteria with dropdown menus.

ปี: 2566

ชื่อรายการ/โครงการ: โครงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร: 1,320,900.00 บาท

แหล่งงบประมาณ: งบจังหวัด

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580): ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นแผนแม่บท: ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว

เป้าหมายแผนแม่บท: 3. ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น

ตัวชี้วัดแผนแม่บท: 2. การพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (อันดับของโลก ภายในปี 2570/2575/2580) ในปี 2566 - 2570 อยู่ในอันดับไม่เกิน 28

ประเด็นแผนแม่บทย่อย: แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย: เป้าหมายที่ 1 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดแผนแม่บทย่อย: 2. อัตราการขยายตัวของ รายได้จากการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และ วัฒนธรรม (ร้อยละต่อปี) ในปี 2566 -2570 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13: หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

เป้าหมายหมุดหมาย: เป้าหมายที่ 3 การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

ตัวชี้วัดหมุดหมาย: 2. ชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ชุมชน

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3: แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเด็นการพัฒนา: ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว (Tourism Experience)

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา: กลยุทธ์ที่ 1 สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวอันน่าประทับใจที่มีคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Value - Based)

แผนปฏิบัติการประจำปีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี พ.ศ. 2566: แผนปฏิบัติการประจำปีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี พ.ศ. 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์: 2 สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย

เป้าประสงค์: ชุมชนท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนา และมีโอกาสในการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด: 1. จำนวนมาตรการ/โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น (ค่าเป้าหมายปี 2570 : 5 มาตรการ/โครงการ) หน่วยงานรับผิดชอบ : สป.กท.-ก

## ขั้นตอนที่ 5 ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดให้ครบทุกหัวข้อ "ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที"

กด "บันทึก" ก่อนดำเนินการเมนูถัดไปทุกครั้ง

ต้องระบุให้ครบถ้วน

## ขั้นตอนที่ 6 ผู้ใช้งานรายงานผลการดำเนินงานให้ครบทุกหัวข้อ พร้อมแนบรูปประกอบ "ระยะเวลาดำเนินการ 5-10 นาที"

กด "บันทึก" ก่อนดำเนินการเมนูถัดไปทุกครั้ง

แนบรูป

ต้องระบุให้ครบถ้วน

- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการขอรหัสผู้ใช้งาน



อัพเดทเมื่อ ตุลาคม 2567

โดย กลุ่มติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
